

GINCO EMPRESARIAL

DUBAI

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ABRIL**

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Período 04/04 à 08/04



Foto: 01



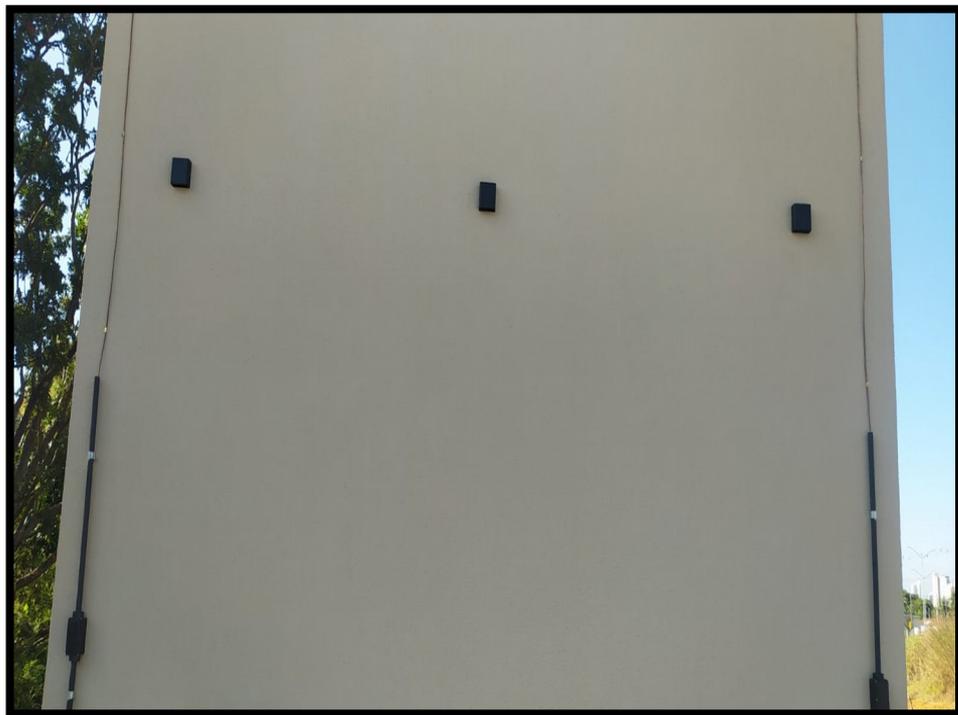
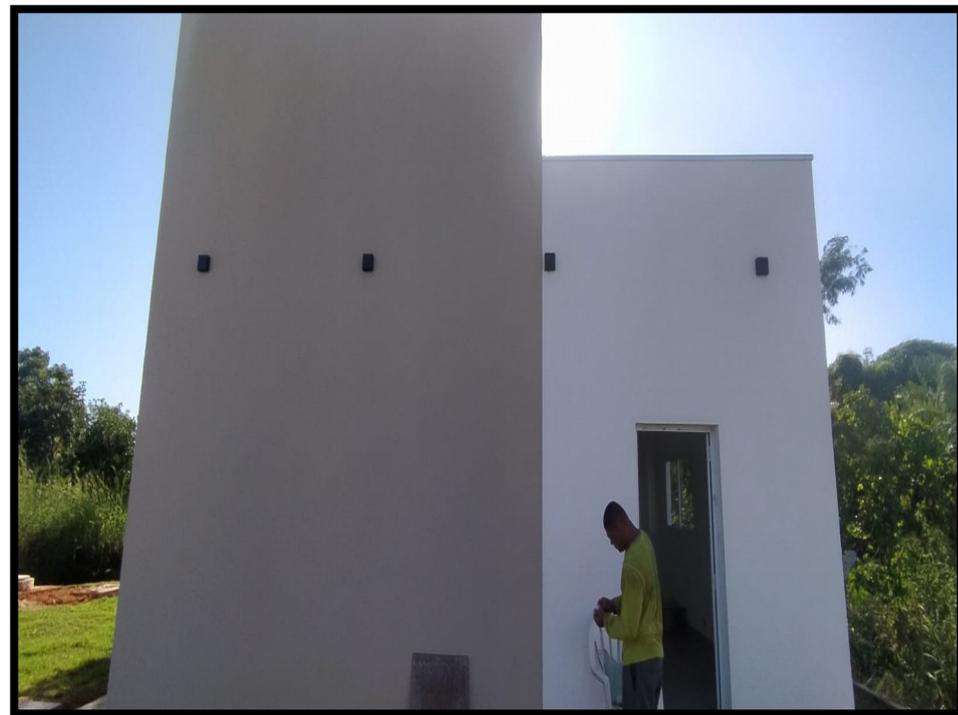
Foto: 02

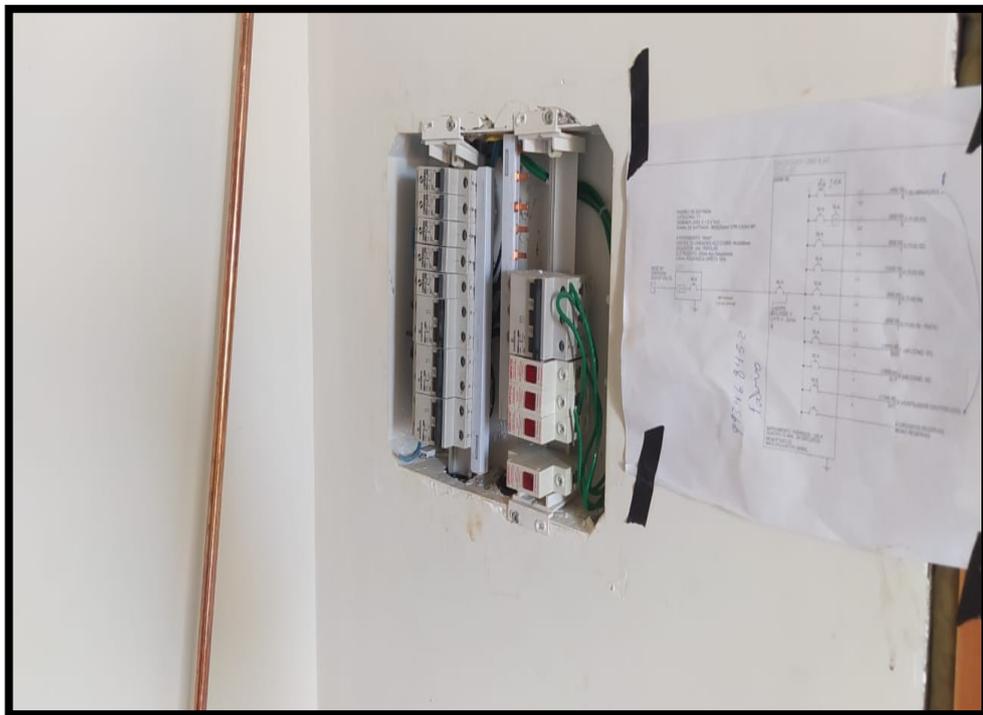
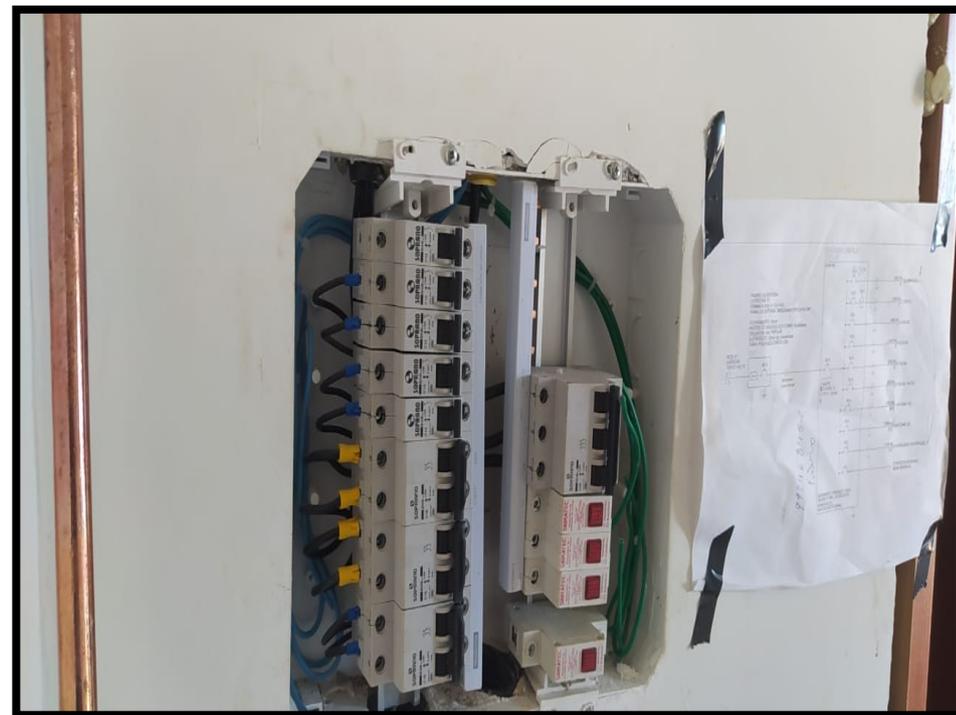
Fotos: 01 e 02

Serviço: Plantio de grama esmeralda.

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Adnes

**Foto: 03****Foto: 04****Fotos: 03 e 04****Serviço: Instalação das arandelas****Local: Edificação de serviço****Empreiteiro: Inova**

**Foto: 05****Foto: 06****Fotos: 05 e 06****Serviço: Instalação do quadro de distribuição****Local: Edificação de serviço****Empreiteiro: Inova**

Período 11/04 à 15/04

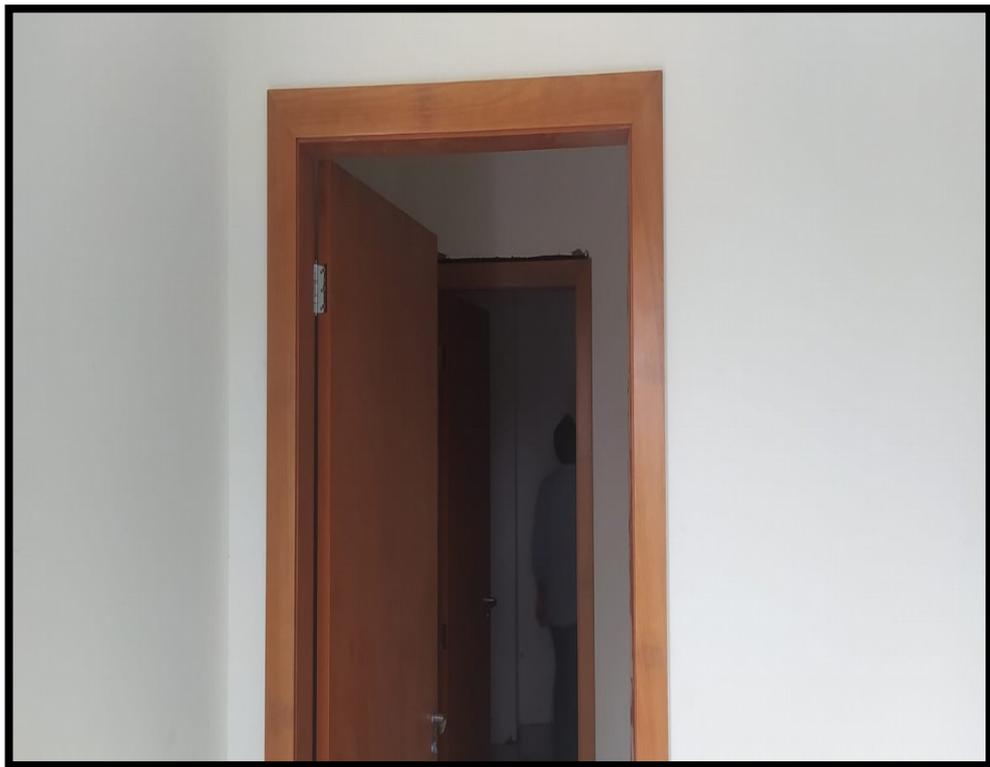


Foto: 07



Foto: 08

Fotos: 07 e 08

Serviço: Instalação das portas de madeira

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Portas Paraná

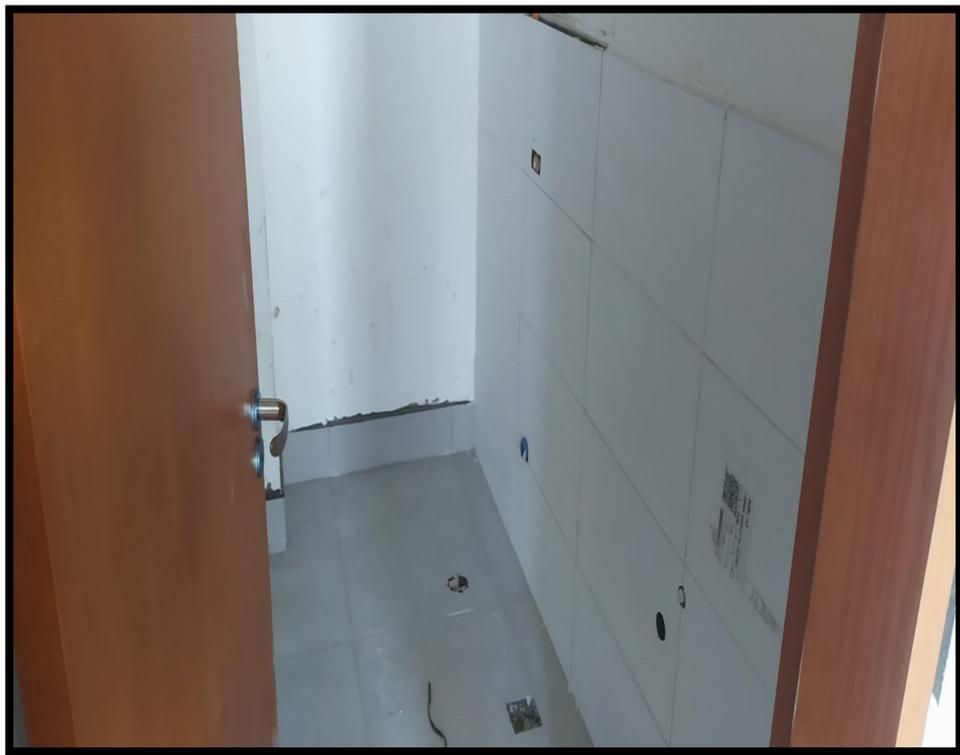


Foto: 09



Foto: 10

Fotos: 09 e 10

Serviço: Assentamento de porcelanato.

Local: Edificação de serviço



Foto: 11



Foto: 12

Fotos: 11 e 12

Serviço: Instalação do SPDA

Local: Edificação de serviço

Empreiteiro: Inova

ACOMPANHAMENTO

RESUMO - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Descrição	Projetado	Executado	Porcentagem exec.
Galeria - Ramal (400mm) - Metros	421,9	421,9	100%
Galeria - Rede (600mm) - Metros	263	263	100%
Poços de visita - Unidade	19	19	100%
Boca de lobo - Unidade	39	39	100%

RESUMO - REDE DE ÁGUA			
Descrição	Projetado	Executado	Porcentagem exec.
Rede de água 63mm - Metros	1417,03	1417,03	100%
Ramais - Lotes - Unidades	116	116	100%

RESUMO - ESGOTO			
Descrição	Projetado	Executado	Porcentagem exec.
Rede de esgoto (150mm) - Metros	1397,51	1375,71	100%
Rede de esgoto (100mm) - Metros	882	882	100%
Caixa de Inspeção (CI) - Unidades	116	116	100%
Poço de visita (PV) - Unidades	23	22	100%

RESUMO - TERRAPLENAGEM			
Descrição	Projetado m³	Executado m³	Porcentagem exec. (%)
Quadra 01	10670,93	10670,93	100%
Quadra 02	589,79	589,79	100%
Quadra 03	2909,26	2909,26	100%
Quadra 04	5406,17	5406,17	100%
Quadra 05	2065,09	2065,09	100%
Estacionamento A	1419,77	1419,77	100%
Estacionamento B	2052,26	2052,26	100%
Estacionamento C	2706,31	2706,31	100%

RESUMO - MEIO-FIO E SARJETA			
Local	Projetado (m)	Executado (m)	Porcentagem exec.
Avenida Juarez	5418	5418	100%
Estacionamento A	308	308	100%
Estacionamento B	413	413	100%
Estacionamento C	650	650	100%

RESUMO - PLANTIO DE CAPIM			
Local	Projetado (m²)	Executado (m²)	Porcentagem exec.
Empresarial Dubai	45627,21	45627,21	100%

RESUMO - REDE DE MONITORAMENTO			
Local	Projetado (m)	Executado (m)	Porcentagem exec.
Empresarial Dubai	1676,69	1676,69	100%

RESUMO - CALÇADA			
Local	Projetado (m ²)	Realizado (m ²)	Porcentagem exec.
Av. Juarez/Empresarial Dubai	3597,57	3567,57	100%

RESUMO - DRENO DE PAVIMENTO			
Local	Projetado (m)	Executado (m)	Porcentagem exec.
Avenida Juarez	5418,036	5418,036	100%
Estacionamento A	460,79	460,79	100%
Estacionamento B	510,29	510,29	100%
Estacionamento C	539,53	539,53	100%
Total	6928,646	6928,646	100%

RESUMO - EMPRESARIAL DUBAI	
DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM EXEC.
REDE DE ÁGUA	100%
REDE DE ESGOTO	100%
TERRAPLENAGEM	100%
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	100%
REDE ELÉTRICA	100%
PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA	100%
PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO	100%
PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO	100%
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	100%
GRAMA ESMERALDA	100%
PLANTIO DE CAPIM	100%
MEIO FIO E SARJETA	100%
DRENO DE PAVIMENTO	100%
MONITORAMENTO - INFRAESTRUTURA	100%
MONITORAMENTO - INSTALAÇÕES E POSTEAMENTO	0,0%
CALÇADA	100%
ADMINISTRAÇÃO	100%
ADUTORA	100%
EMISSÁRIO	100%
SINALIZAÇÃO	100%
PAISAGISMO	100%
ESTAR	100%
ESTAÇÃO DE GINÁSTICA	100%
PLAYGROUND	80%
PET PARK	100%
MONUMENTO	100%
PISTA DE COOPER	100%
ÁREA DE CERCAMENTO	100%
ANDAMENTO GERAL DA OBRA	96%

MAPA DE IMPLANTAÇÃO



GINCO EMPRESARIAL
DUBAI

Gincorange Incorporações Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 22.535.405/0001-81, com sede à Av. Miguel Sutil, nº 8081, Sala 0-18, bairro Duques de Caxias, Curitiba-PR. Prospeção e comercialização não estão autorizadas. Não é autorizada a veiculação deste material por terceiros para fins de divulgação nem comercialização. GINCO - CRECI 1008-1

GINCO
Desenvolvimento

GINCO

www.ginco.com.br
