

GINCO EMPRESARIAL
CHICAGO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
AGOSTO**

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Período 01/08 à 05/08

**Foto: 01****Foto: 02****Fotos: 01 e 02**

Serviço: Escavação dos ramais da Galeria de Águas Pluviais.

Local: Rua da Prosperidade

Execução: José Maria.



Foto: 03



Foto: 04

Fotos: 03 e 04

Serviço: Reaterro da rede de águas pluviais e nivelamento do fundo do poço de visita.

Local: Rua do Futuro.

Execução: José Maria.

Período 08/08 à 12/08

**Foto: 05****Foto: 06****Fotos: 05 e 06**

Serviço: Assentamento e concretagem dos poços de visita de águas pluviais.

Local: Rua do Futuro.

Execução: José Maria.

**Foto: 07****Foto: 08****Fotos: 07 e 08**

Serviço: Rejuntamento e assentamento das tampas dos poços de visita da Galeria de águas pluviais.

Local: Avenida Principal.

Execução: José Maria.



Foto: 09



Foto: 10

Fotos: 09 e 10

Serviço: Rejuntamento interno e assentamento das tampas dos poços de visita da Galeria de águas pluviais.

Local: Rua da Prosperidade e Rua da Conquista.

Execução: José Maria.

Período 15/08 à 19/08



Foto: 11



Foto: 12

Fotos: 11 e 12

Serviço: Assentamento e rejuntamento dos tubos da Galeria de águas pluviais.

Local: Rua do Sucesso.

Execução: José Maria.

**Foto: 13****Foto: 14****Fotos: 13 e 14**

Serviço: Concretagem e rejuntamento interno dos poços de visitas de águas pluviais.

Local: Rua do Sucesso.

Execução: José Maria.


**Foto: 15****Foto: 16****Fotos: 15 e 16**

Serviço: Compactação de material de reaterro da Galeria de águas pluviais.


Local: Rua do Sucesso.

Execução: José Maria.

ACOMPANHAMENTO

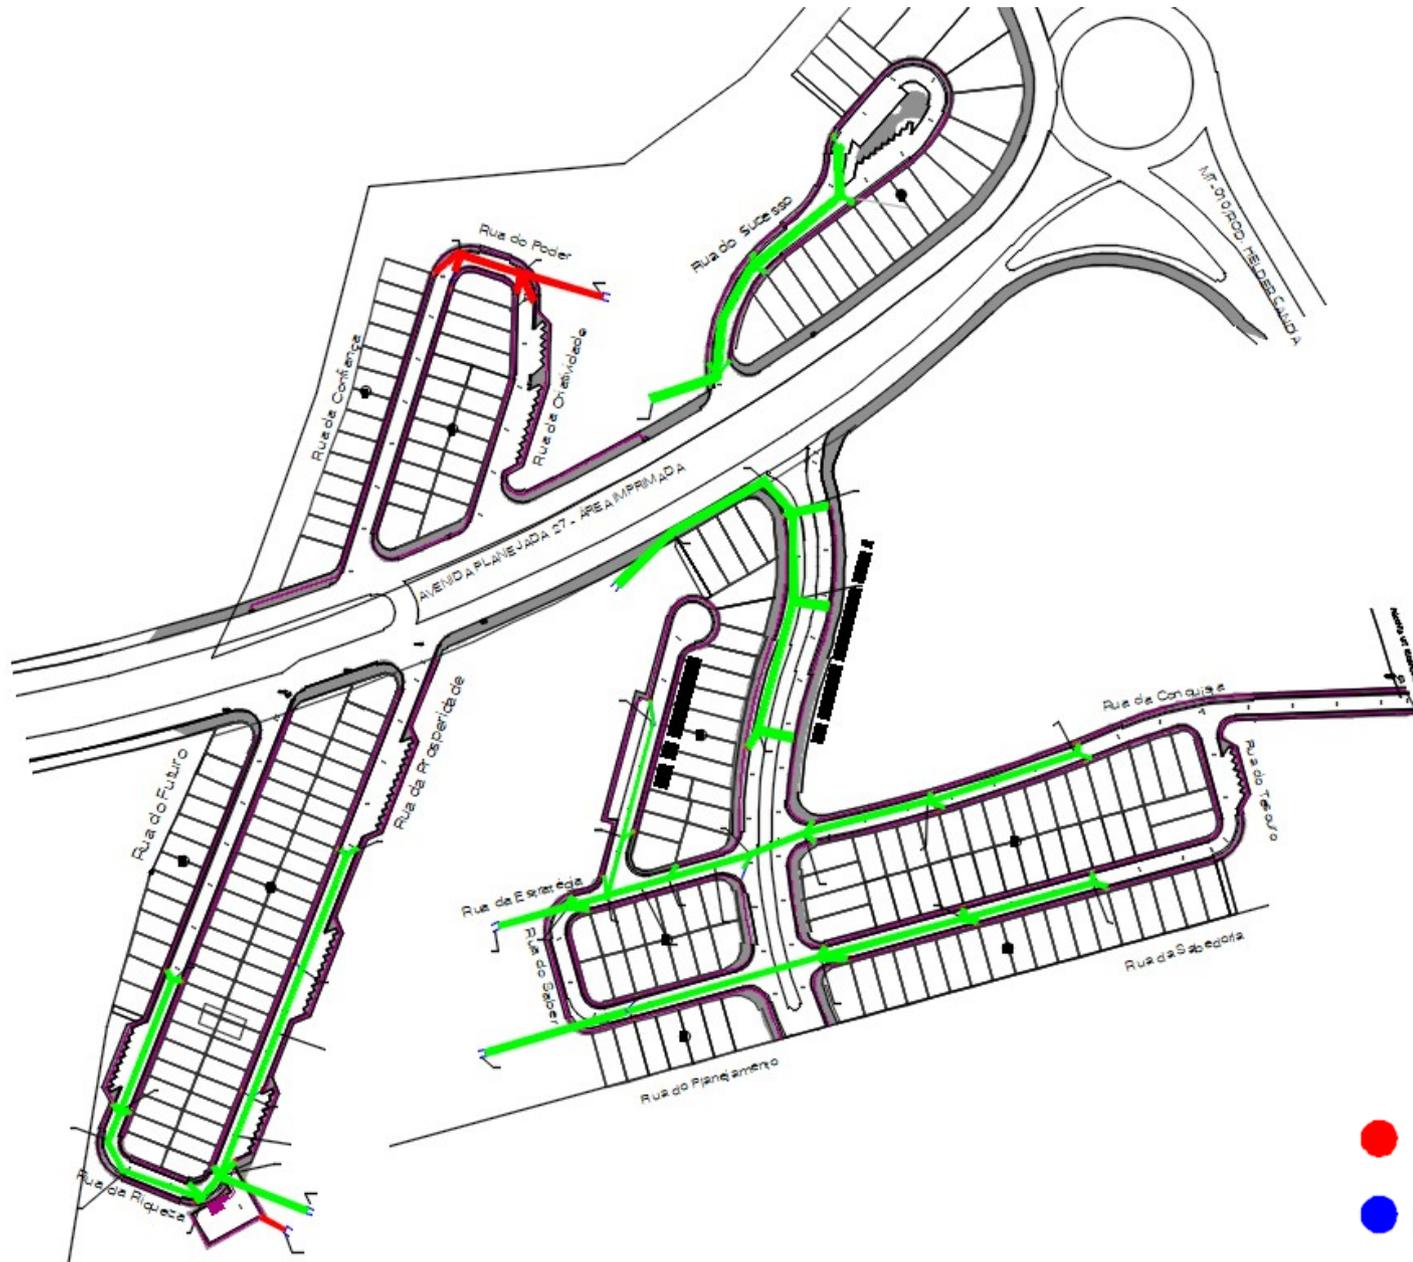

- NÃO EXECUTADO
- EM EXECUÇÃO
- FINALIZADA

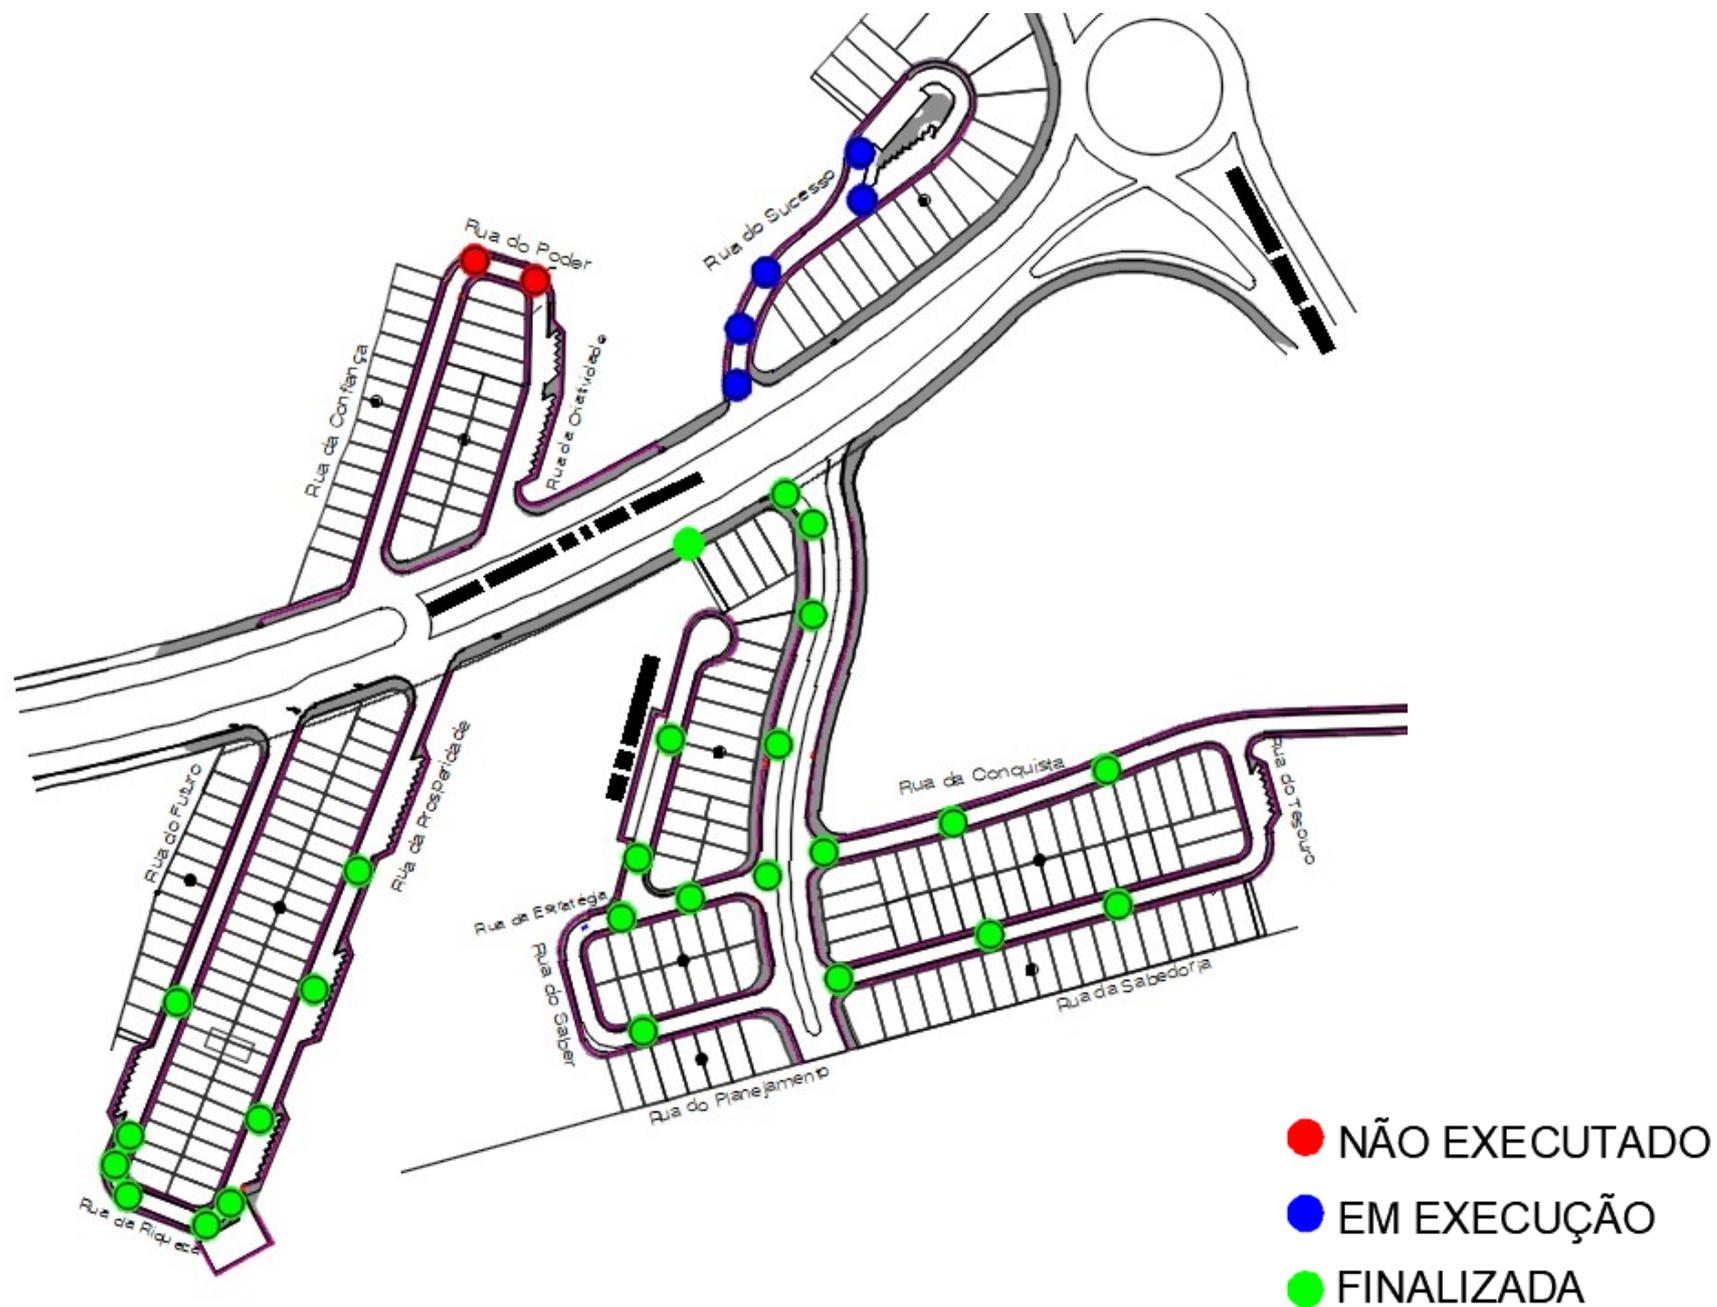

RESUMO - EMPRESARIAL CHICAGO	
PREVISÃO DE ENTREGA NOVEMBRO DE 2022	
DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM EXEC.
ADUTORA	0,0%
EMISSÁRIO DE ESGOTO	100,0%
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	0,0%
INFRAESTRUTURA	0,0%
REDE ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO	0,0%
PAISAGISMO	0,0%
GRAMA ESMERALDA	0,0%
CALÇADAS E ACESSOS	0,0%
LIMPEZA DA AREA	0,0%
TERRAPLENAGEM	94,4%
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	93,3%
REDE DE ESGOTO	0,0%
REDE DE ÁGUA	0,0%
DRENO DE PAVIMENTO	0,0%
MEIO FIO E SARJETA	0,0%
PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA	0,0%
PAVIMENTAÇÃO - BETUMINOSOS	0,0%
SINALIZAÇÃO	0,0%
REDE ELÉTRICA	0,0%
SISTEMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇOS - FIBRA ÓPTICA	0,0%
PAISAGISMO - PLANTIO DO CAPIM	0,0%
PAISAGISMO - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,0%
EDIFICAÇÕES / ESTRUTURAS DE LAZER	0,0%
PORTARIA (ADMINISTRAÇÃO)	0,0%
CALÇADAS DE ACESSO / PISTA DE COOPER	0,0%
ACESSOS EM PAVER	0,0%
MONUMENTO	0,0%
ESTAR PERGOLADO ARCO	0,0%
ANDAMENTO GERAL DA OBRA	10,3%



GINCO
GINCO
